


گزارش وضعیت پروژه‌های تفاهم نامه طرح تکمیل، تجهیز، راه‌اندازی و افتتاح ۲۰۰۰ واحد بهداشتی در کشور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

بهار ۱۴۰۳



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
ARDABIL UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES



معاونت توسعه مدیریت و منابع

مقدمه

۴

پروژه‌های در حال بهره‌برداری

۵

۶

احداث آزمایشگاه مرکزی شهرستان اردبیل

۶

احداث ۱۲ واحد زیست پزشکی شهرستان گرمی

۷

احداث ساختمان ستاد شبکه شهرستان انگوت

۷

احداث مرکز جامع سلامت شهید باکری شهرستان گرمی

۸

احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کوجنق (به همراه زیست پزشکی و زیست سرایداری) شهرستان مشگین‌شهر

۸

احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حسن‌باروق شهرستان اردبیل

۹

احداث پایگاه سلامت کوی امام رضا (ع) (شماره ۷) شهرستان مشگین‌شهر

۹

احداث پایگاه سلامت مخابرات (شماره ۳۰) شهرستان اردبیل

۱۰

احداث پایگاه سلامت کشاورز ۱۹ شهرستان اردبیل

۱۰

احداث پایگاه سلامت ولیعصر (عج) شهرستان گرمی

۱۱

احداث پایگاه سلامت مسکن مهر شهرستان پارس‌آباد

۱۱

دیوارکشی خانه بهداشت ایرنجی شهرستان نیر

۱۲

احداث خانه بهداشت قره‌خانبیگلو شهرستان انگوت

۱۲

دیوارکشی خانه بهداشت شیران شهرستان نیر

۱۳

پروژه‌های در حال ساخت

۱۴

احداث آموزشگاه بهورزی اردبیل (ادغام با پایگاه آزادی و مرکز آزادگان)

۱۴

احداث سوله انبار دارویی معاونت غذا و دارو

۱۵

احداث ساختمان ستاد شبکه و مرکز بهداشت شهرستان بیله‌سوار

۱۵

احداث ۹ واحد زیست پزشکی شهرستان بیله‌سوار

بیانات رهبری

مسئله‌ی سلامت، جزو مسائل درجه‌ی یک هر کشوری است، یعنی اگر ما دو سه مسئله‌ی درجه‌ی یک را بخواهیم کنار هم بگذاریم، بلاشک یکی از آنها مسئله‌ی سلامت و بهداشت و درمان است.

۱۳۹۱/۱۰/۱۱





- ۲۶ دیوارکشی پایگاه سلامت کشاورز ۱۹ شهرستان اردبیل
- ۲۷ دیوارکشی خانه بهداشت روستای آغدام شهرستان پارس‌آباد
- ۲۷ دیوارکشی خانه بهداشت روستای عزیزکندی شهرستان بیله‌سوار
- ۲۸ دیوارکشی خانه بهداشت روستای عربلو شهرستان پارس‌آباد

۲۹ پروژه‌های شروع نشده

- ۱۶ احداث مرکز جامع سلامت شهید بهشتی شهرستان گرمی
- ۱۶ احداث مرکز جامع سلامت شهری نیر
- ۱۷ احداث مرکز جامع سلامت شماره ۱ شهرستان نمین
- ۱۷ احداث مرکز جامع سلامت شماره ۲ شهرستان نمین

- ۱۸ احداث ۶ واحد زیست پزشکی شهرستان پارس‌آباد
- ۱۸ احداث ۶ واحد زیست پزشکی شهرستان مشگین‌شهر

- ۱۹ احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خلیفه‌لو شهرستان بیله‌سوار
- ۱۹ احداث مرکز خدمات جامع سلامت زهراکندی شهرستان گرمی

- ۲۰ احداث پایگاه سلامت شهرستان نمین
- ۲۰ احداث پایگاه سلامت سیدآباد شهرستان اردبیل

- ۲۱ احداث زیست پزشکی ثمرین شهرستان اردبیل
- ۲۱ احداث خانه بهداشت روستای جهان‌خانملو شهرستان بیله‌سوار

- ۲۲ احداث خانه بهداشت روستای آلی‌شعبانلو (آلی‌کندی) شهرستان بیله‌سوار
- ۲۲ احداث خانه بهداشت روستای خانگلدی مستانلو شهرستان بیله‌سوار

- ۲۳ احداث خانه بهداشت روستای فرهنگ خدایار شهرستان بیله‌سوار
- ۲۳ دیوارکشی پایگاه سلامت شماره ۲ اسلام‌آباد شهرستان پارس‌آباد

- ۲۴ دیوارکشی پایگاه سلامت شماره ۶ امیدیه شهرستان پارس‌آباد
- ۲۴ دیوارکشی پایگاه سلامت مخابرات ۳۰ شهرستان اردبیل

- ۲۵ دیوارکشی مرکز خدمات جامع سلامت روستای دیمان شهرستان نیر
- ۲۵ دیوارکشی خانه بهداشت روستای خلیفه‌لو شهرستان بیله‌سوار

- ۲۶ دیوارکشی مرکز خدمات جامع سلامت نیستان شهرستان اردبیل

کتابچه حاضر با حمایت مالی شرکت سایه افکن اردبیل تهیه و منتشر شده است.





مقدمه

در هر جامعه‌ای، بهداشت و درمان به عنوان یکی از بخش‌های مهم اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت و تندرستی افراد جامعه دارد. شبکه‌های بهداشتی، درمانی نیز یکی از دستاوردهای ارزنده و افتخارآمیزی است که همگان بر موفقیت آن اذعان دارند چرا که در بهبود شاخص‌های سلامتی جامعه نقش تعیین‌کننده داشته‌اند.

از آنجایی که انسان محوری از ارکان توسعه پایدار است و در توسعه پایدار، انسان، محور توسعه و مستحق بهداشت، زندگی سازنده و در هماهنگی با طبیعت معرفی می‌شود، دانستن این موضوع که وجود محیط فیزیکی عامل تعیین‌کننده در سلامت انسان و جهان هستند نشان می‌دهد که این مهم، کلیدی به سمت یک سیاره سالم است.

با توجه به رشد جمعیت و افزایش میانگین سنی جامعه همچنین بالارفتن استانداردهای ارائه خدمت، نیاز به ایجاد زیرساخت‌های مناسب در حوزه بهداشت و درمان بیش از پیش احساس می‌شود. در این راستا، ایجاد مراکز ارائه خدمت با تکیه بر زیرساخت‌های مناسب می‌تواند بهبود وضعیت سلامت جامعه را به دنبال داشته باشد.

امروز مهمترین مساله و اولویت توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل پروژه‌های بهداشتی و خانه‌های بهداشت است و بهداشت بر درمان اولویت دارد. ارتقای زیرساخت‌های نظام شبکه و توزیع عادلانه خدمات سبب سلامت به ویژه در مناطق مرزی، روستایی و حاشیه شهرها از اهداف مورد نظر پروژه‌های بهداشتی و درمانی بوده و تکمیل، تجهیز و راه اندازی این پروژه گامی موثر در رسیدن به اهداف اصلی حوزه سلامت می‌باشد. این مهم از چند سال گذشته در سطح وزارت متبوعه از برنامه‌های اولویت‌دار بوده و بدین جهت با حمایت‌های مقام عالی وزارت، معاونت توسعه و مدیریت منابع فیزیکی اهتمام جدی برای پیشبرد اهداف مورد نظر در تامین فضاهای حوزه بهداشتی داشته‌اند. مجموعه حاضر، نمایی از همت والای مجموعه وزارت بهداشت بوده که در سطح دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اجرا شده است که شایسته است از زحمات و پیگیری‌های مستمر جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، آقای مهندس ساکی مدیر محترم منابع فیزیکی و سرکار خانم مهندس جهانبانی معاون محترم مدیریت منابع فیزیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشیم.

تعداد پروژه‌های در دست اجرای دانشگاه خصوصاً پروژه‌های مربوط به تفاهم نامه ۲۰۰۰ واحدی بهداشتی ۷۹ پروژه بوده که در قالب پروژه‌های بهره‌برداری شده، در حال تکمیل و پروژه‌های شروع نشده (به علت نبود زمین و مشکلات سند، فعلاً شروع نشده و سریعاً دانشگاه اقدام به رفع مشکلات آن‌ها نموده است) ارائه می‌گردد.

خداوند بزرگ را شاکریم که با حمایت‌های این عزیزان در تکمیل و رفع کمبودهای زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی گام موثری برداشته‌ایم و امیدواریم بتوانیم با تکمیل و تجهیز و همچنین تامین نیروی انسانی، در ارائه خدمات مطلوب به مردم منطقه قدم‌های مثبتی برداریم.

سعادت جلیلی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

پروژه‌های در حال بهره‌برداری

احداث آزمایشگاه مرکزی شهرستان اردبیل

محل احداث:	شهرستان اردبیل
تاریخ شروع:	۱۳۹۶
تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۱
زیربنا:	۱۶۵۷ مترمربع
تعداد طبقات:	۲
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	مجمع خیرین سلامت
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی - خیرین
اعتبار هزینه شده:	۱۵۹/۵۲۲ میلیون ریال



احداث ساختمان ستاد شبکه شهرستان انگوت

محل احداث:	شهرستان انگوت
تاریخ شروع:	۱۳۹۹
تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۲
زیربنا:	۷۸۰ مترمربع
تعداد طبقات:	۳
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	مجمع خیرین سلامت - امانی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	استانی - خیرین
اعتبار هزینه شده:	۶۰/۰۰۰ میلیون ریال

احداث مرکز جامع سلامت شهید باقری شهرستان گرمی

محل احداث:	شهرستان گرمی
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۲
زیربنا:	۵۷۹ مترمربع
تعداد طبقات:	۲
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	فنی و مهندسی سایه افکن اردبیل
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	استانی
اعتبار هزینه شده:	۱۰۰/۰۰۰ میلیون ریال

احداث ۱۲ واحد زیست پزشکی شهرستان گرمی

محل احداث:	شهرستان گرمی
تاریخ شروع:	۱۳۹۸
تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۲
زیربنا:	۱۴۳۷ مترمربع
تعداد طبقات:	۴
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	شرکت هراز آبراه - امانی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۷۰/۰۰۰ میلیون ریال



احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کوجنق (به همراه زیست پزشکی و زیست سرایداری) شهرستان مشگین شهر

محل احداث:	روستای کوجنق
تاریخ شروع:	۱۳۹۶
تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۲
زیربنا:	۵۲۳ مترمربع
تعداد طبقات:	۲
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	سیال سازه آرتا - امانی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی - استانی
اعتبار هزینه شده:	۴۱/۳۰۸ میلیون ریال



احداث پایگاه سلامت کوی امام رضا (ع) (شماره ۷) شهرستان مشگین شهر

محل احداث:	شهرستان مشگین شهر
تاریخ شروع:	۱۳۹۷
تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۲
زیربنا:	۲۷۲ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	کوشک سپنتا شهر رادیس
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی - استانی
اعتبار هزینه شده:	۴۴/۹۴۰ میلیون ریال



احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حسن باروق شهرستان اردبیل

محل احداث:	روستای حسن باروق
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۴۹۶ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	کوشک سپنتا شهر رادیس
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی - استانی
اعتبار هزینه شده:	۹۰,۰۰۰ میلیون ریال



احداث پایگاه سلامت مخابرات (شماره ۳۰) شهرستان اردبیل

محل احداث:	شهرستان اردبیل
تاریخ شروع:	۱۴۰۰
تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۲
زیربنا:	۲۷۰ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	آراد تیک شمالغرب
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی - استانی
اعتبار هزینه شده:	۵۴/۶۴۰ میلیون ریال





احداث پایگاه سلامت کشاورز ۱۹ شهرستان اردبیل

محل احداث:	شهرستان اردبیل
تاریخ شروع:	۱۴۰۰
تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۲۷۰ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	تیز مهر طراحان سبلان
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی - استانی
اعتبار هزینه شده:	۴۲,۰۰۰ میلیون ریال



احداث پایگاه سلامت مسکن مهر شهرستان پارس‌آباد

محل احداث:	شهرستان پارس‌آباد
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۲۵۰ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	آذر مهام آسان دشت
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	استانی
اعتبار هزینه شده:	۵۲,۰۰۰ میلیون ریال



احداث پایگاه سلامت ولیعصر (عج) شهرستان گرمی

محل احداث:	شهرستان گرمی
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۲
زیربنا:	۲۵۰ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	افرند سازه شمالغرب
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	استانی
اعتبار هزینه شده:	۵۰/۰۰۰ میلیون ریال



دیوارکشی خانه بهداشت ایرنجی شهرستان نیر

محل احداث:	روستای ایرنجی
تاریخ شروع:	۱۴۰۲
تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۲
زیربنا:	۵۵ مترطول
تعداد طبقات:	-
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	امانی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۵۰۰ میلیون ریال



پروژه های در حال ساخت

احداث خانه بهداشت قره‌خانبیگلو شهرستان انگوت



محل احداث:	روستای قره‌خانبیگلو
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۱
زیربنا:	۷۶ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	خاک آب شمالغرب
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی - استانی
اعتبار هزینه شده:	۸/۰۰۰ میلیون ریال

دیوارکشی خانه بهداشت شیران شهرستان نیر



محل احداث:	روستای شیران
تاریخ شروع:	۱۴۰۲
تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۲
زیربنا:	۶۶ مترطول
تعداد طبقات:	-
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	امانی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۱/۵۰۰ میلیون ریال



احداث آموزشگاه بهورزی اردبیل (ادغام با پایگاه آزادی و مرکز آزادگان)

محل احداث:	شهرستان اردبیل
تاریخ شروع:	۱۴۰۲
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۵
زیربنا:	۲۰۰۳ مترمربع
تعداد طبقات:	۶
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	فنی و مهندسی سایه افکن اردبیل
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۸۱/۶۱۹ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۳۵۰/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۲۰ درصد




احداث ساختمان ستاد شبکه و مرکز بهداشت شهرستان بیله سوار

محل احداث:	شهرستان بیله سوار
تاریخ شروع:	۱۳۹۶
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۱۰۳۲ مترمربع
تعداد طبقات:	۳
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	شیروان سارای
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی - استانی
اعتبار هزینه شده:	۸۲/۰۷۴ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۸۰/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۹۲ درصد

احداث ۹ واحد زیست پزشکی شهرستان بیله سوار

محل احداث:	شهرستان بیله سوار
تاریخ شروع:	۱۳۹۸
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۸۹۲ مترمربع
تعداد طبقات:	۴
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	امانی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۲۱/۴۲۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۶۵/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۹۰ درصد

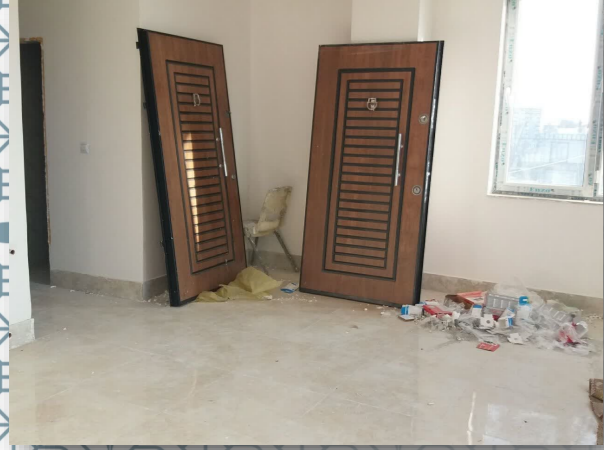

احداث سوله انبار دارویی معاونت غذا و دارو

محل احداث:	شهرستان اردبیل
تاریخ شروع:	۱۴۰۲
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۱۱۰۵ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	شیروان سارای
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۲۳/۱۸۹ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۱۳۵/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۷۰ درصد





احداث مرکز جامع سلامت شهید بهشتی شهرستان گرمی

محل احداث:	شهرستان گرمی
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
پیش‌بینی تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۴
زیربنا:	۶۰۲ مترمربع
تعداد طبقات:	۲
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	شیروان سارای
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۵۰/۰۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۹۲/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۵۰ درصد



احداث مرکز جامع سلامت شماره ۱ شهرستان نمین

محل احداث:	شهرستان نمین
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
پیش‌بینی تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۵۹۰ مترمربع
تعداد طبقات:	۲
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	عمران دام تیک آراد
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی - نفت
اعتبار هزینه شده:	۶۵/۰۴۹ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۴۵/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۹۵ درصد



احداث مرکز جامع سلامت شماره ۲ شهرستان نمین

محل احداث:	شهرستان نمین
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
پیش‌بینی تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۵۹۰ مترمربع
تعداد طبقات:	۲
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	نوبین او
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۲۰/۵۷۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۸۰/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۳۵ درصد



احداث مرکز جامع سلامت شهری نیر


محل احداث:	شهرستان نیر
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
پیش‌بینی تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۴
زیربنا:	۶۰۰ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	آرام بنای پاسارگاد
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی - استانی
اعتبار هزینه شده:	۳۹/۸۳۱ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۱۱۲/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۲۰ درصد





احداث ۶ واحد زیست پزشکی شهرستان پارس آباد

محل احداث:	شهرستان پارس آباد
تاریخ شروع:	۱۳۹۸
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۵۴۶ مترمربع
تعداد طبقات:	۴
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	آذر مهام آسان دشت
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۲۱/۱۶۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۵۵/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۹۰ درصد

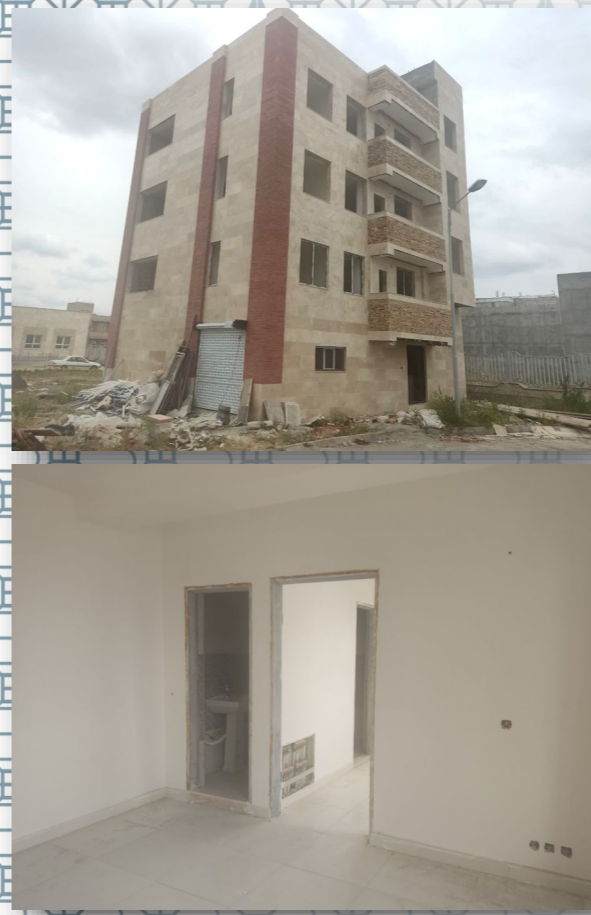

احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خلیفه لو شهرستان بيله سوار

محل احداث:	روستای خلیفه لو
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۴۹۶ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	ارس سازه مغان
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۸۸/۵۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۴۰/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۷۰ درصد

احداث مرکز خدمات جامع سلامت زهراکندی شهرستان گرمی

محل احداث:	شهر زهرا
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۴۱۵ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	آتامان یورد یول
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۲۵/۷۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۷۰/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۳۵ درصد



احداث ۶ واحد زیست پزشکی شهرستان مشگین شهر

محل احداث:	شهرستان مشگین شهر
تاریخ شروع:	۱۳۹۸
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۵۴۶ مترمربع
تعداد طبقات:	۴
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	کوشک سپینتا شهر رادیس
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۶/۶۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۷۵/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۶۵ درصد



احداث پایگاه سلامت شهرستان نمین

محل احداث:	شهرستان نمین
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
پیش‌بینی تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۲۵۰ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	آرادتیک شمالغرب
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی - استانی
اعتبار هزینه شده:	۳۶/۲۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۱۵/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۹۵ درصد



احداث زیست پزشکی ثمرین شهرستان اردبیل

محل احداث:	شهر ثمرین
تاریخ شروع:	۱۴۰۲
پیش‌بینی تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۴
زیربنا:	۲۰۰ مترمربع
تعداد طبقات:	۲
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	عمران دام تیک آراد
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۱۰/۰۹۱ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۴۵/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۲۰ درصد



احداث پایگاه سلامت سیدآباد شهرستان اردبیل

محل احداث:	شهرستان اردبیل
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
پیش‌بینی تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۲۱۶ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	خاک آب شمالغرب
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی - استانی
اعتبار هزینه شده:	۳۴/۰۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۱۵/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۹۴ درصد



احداث خانه بهداشت روستای جهان‌خانلو شهرستان بیله‌سوار

محل احداث:	روستای جهان‌خانلو
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
پیش‌بینی تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۷۵ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	آذر مهام آسان دشت
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	استانی - ملی
اعتبار هزینه شده:	۱۲/۲۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۱۲/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۹۰ درصد





احداث خانه بهداشت روستای آلشعبانلو (آلی کندی) شهرستان بيله سوار

محل احداث:	روستای آلشعبانلو (آلی کندی)
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۷۵ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	شیباسازان اوجال بیگدل
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	استانی - ملی
اعتبار هزینه شده:	۱۴/۴۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۹/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۱۰۰ درصد



احداث خانه بهداشت روستای فرهنگ خدایار شهرستان بيله سوار

محل احداث:	روستای فرهنگ خدایار
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۷۵ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	ارس سازه مغان
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	استانی - ملی
اعتبار هزینه شده:	۱۲/۰۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۱۲/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۹۰ درصد

احداث خانه بهداشت روستای خانگلدی مستانلو شهرستان بيله سوار

محل احداث:	روستای خانگلدی مستانلو
تاریخ شروع:	۱۴۰۱
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۷۵ مترمربع
تعداد طبقات:	۱
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	شیباسازان اوجال بیگدل
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	استانی - ملی
اعتبار هزینه شده:	۱۰/۵۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۹/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۱۰۰ درصد



دیوارکشی پایگاه سلامت شماره ۲ اسلام آباد شهرستان پارس آباد

محل احداث:	بخش اسلام آباد
تاریخ شروع:	۱۴۰۲
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۵۲ مترطول
تعداد طبقات:	-
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	آقای هوشنگ سیفی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۱/۸۵۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۲/۵۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۱۰ درصد



دیوارکشی پایگاه سلامت شماره ۶ امیدیه شهرستان پارس آباد

محل احداث:	شهرستان پارس آباد
تاریخ شروع:	۱۴۰۲
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۱۷۰ مترطول
تعداد طبقات:	-
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	آقای هوشنگ سیفی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۱٫۸۵۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۶٫۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۱۵ درصد



دیوارکشی مرکز خدمات جامع سلامت روستای دیمان شهرستان نیر

محل احداث:	روستای دیمان
تاریخ شروع:	۱۴۰۲
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۱۵۳ مترطول
تعداد طبقات:	-
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	امانی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۲٫۳۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۷٫۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۲۵ درصد

دیوارکشی پایگاه سلامت مخابرات ۳۰ شهرستان اردبیل

محل احداث:	شهرستان اردبیل
تاریخ شروع:	۱۴۰۲
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۱۵۸ مترطول
تعداد طبقات:	-
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	امانی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۱٫۱۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۷٫۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۲۵ درصد



دیوارکشی خانه بهداشت روستای خلیفه لو شهرستان بيله سوار

محل احداث:	روستای خلیفه لو
تاریخ شروع:	۱۴۰۲
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۱۴۶ مترطول
تعداد طبقات:	-
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	امانی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۵۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۶٫۵۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۵۰ درصد





دیوارکشی مرکز خدمات جامع سلامت نیستان شهرستان اردبیل

محل احداث:	شهرستان اردبیل
تاریخ شروع:	۱۴۰۲
پیش‌بینی تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۱۳۲ مترطول
تعداد طبقات:	-
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	امانی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۱/۱۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۶/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۲۵ درصد



دیوارکشی خانه بهداشت روستای آغدام شهرستان پارس‌آباد

محل احداث:	روستای آغدام
تاریخ شروع:	۱۴۰۲
پیش‌بینی تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۶۰ مترطول
تعداد طبقات:	-
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	آقای هوشنگ سیفی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۱/۷۵۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۳/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۱۵ درصد

دیوارکشی خانه بهداشت روستای عزیزکندی شهرستان بيله‌سوار

محل احداث:	روستای خلیفه‌لو
تاریخ شروع:	۱۴۰۲
پیش‌بینی تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۶۰ مترطول
تعداد طبقات:	-
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	امانی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۵۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۳/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۱۵ درصد

دیوارکشی پایگاه سلامت کشاورز ۱۹ شهرستان اردبیل

محل احداث:	شهرستان اردبیل
تاریخ شروع:	۱۴۰۲
پیش‌بینی تاریخ بهره‌برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۸۳ مترطول
تعداد طبقات:	-
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	امانی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۱/۱۰۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۴/۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۲۵ درصد




پروژه های شروع نشده

- * ۱۰ واحد زیست پزشکی شهرستان اردبیل (در آستانه شروع)
- * توسعه مرکز خدمات جامع سلامت شهرستان سرعین
- * پایگاه سلامت دانش آباد ۳۵ شهرستان اردبیل
- * پایگاه سلامت مقدس ۳۹ شهرستان اردبیل
- * دیوارکشی خانه بهداشت روستای مهمان دوست شهرستان نیر

دیوارکشی خانه بهداشت روستای عربلو شهرستان پارس آباد



محل احداث:	روستای عربلو
تاریخ شروع:	۱۴۰۲
پیش بینی تاریخ بهره برداری:	۱۴۰۳
زیربنا:	۵۸ مترطول
تعداد طبقات:	-
مجری:	دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیمانکار:	آقای هوشنگ سیفی
ناظر:	مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
محل تامین اعتبار:	ملی
اعتبار هزینه شده:	۱٫۷۵۰ میلیون ریال
اعتبار مورد نیاز:	۳٫۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی:	۱۵ درصد

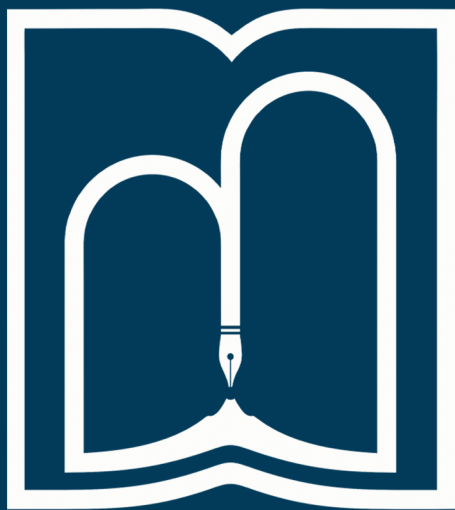

دانشگاه علوم پزشکی
وخدمات بهداشتی درمانی اردبیل
ARDABIL UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
